



Ministero dell'Economia e delle
Finanze
Dipartimento per le Politiche di
Sviluppo

UVER - Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici

Linee guida per l'attività di verifica sulla linea operativa:

Completamenti - Legge 208/98



SOMMARIO

1.	Quadro normativo di riferimento	3
1.1	Le fonti normative	3
1.2	La missione dell'UVER sulla linea operativa "Completamenti"	4
2.	L'attività dell'UVER nella linea operativa "Completamenti"	6
2.1	Attività pregressa	6
2.2	Linea operativa "completamenti": campo d'indagine	6
2.3	Area "Verifica dei progetti": verifiche in loco	8
2.3.1	Finalità delle verifiche in loco	8
2.3.2	L'organizzazione delle verifiche in loco	8
2.3.3	Lo svolgimento delle verifiche in loco	9
2.3.4	Modalità operative per i "completamenti" rientranti nella linea operativa "accompagnamento e assistenza"	12
3.	Il supporto al superamento delle criticità	14
3.1	Le criticità riscontrate e proposte per il superamento	14
	Appendice	16
	Allegato 1: Opere commissariate finanziate ex Legge 208/98.	16
	Allegato 2: Elenco interventi ex Legge 208/98 (completamenti) oggetto dell'attività UVER	17
	Allegato 3: Schede di verifica	26



1. Quadro normativo di riferimento

1.1 Le fonti normative

I compiti istituzionali dell'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici sono riconducibili al seguente quadro normativo:

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 “*Testo unico degli impiegati civili dello stato*” art. 18 e 20;
- Legge 19 maggio 1976, n. 335 “*Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni*”;
- Legge 22 dicembre 1984, n. 887 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato*”;
- Legge 17 dicembre 1986, n. 878 “*Disciplina del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica*”;
- Decreto Legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 “*Unificazione dei Ministeri del Tesoro e del Bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell’art. 7 della Legge 3 aprile 1997, n. 94*”;
- Decreto Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 “*Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*”, art. 7;

L’attività dell’Unità di Verifica presso i soggetti che hanno la responsabilità nella realizzazione degli investimenti pubblici è principalmente indirizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi programmati; si sviluppa in base al proprio mandato, assegnato dalla normativa di riferimento, e anche su specifiche richieste sulle quali l’Unità può essere di volta in volta attivata, a carattere settoriale e con indirizzi operativi, a supporto delle strutture dipartimentali (*Capo del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione del M.E.F.*).

L’attività dell’Unità si sostanzia in particolare nell’accertamento dell’avanzamento dei progetti e/o dei programmi d’investimento, nella verifica dell’osservanza delle tempistiche previste, nell’individuazione di eventuali limiti operativi (*tecnici, amministrativi, finanziari e/o di altra natura*), nel riscontro della realizzazione delle opere e della loro entrata in esercizio, delle ricadute socio-



economiche sul territorio nonché nelle proposte e possibili iniziative da adottare per rimuovere problematiche esistenti.

Inoltre, avvalendosi dei dati e delle informazioni acquisite in occasione delle “*visite in loco*”, l’Unità esegue il monitoraggio e l’analisi sia dei programmi che dei singoli interventi oggetto d’indagine, per fornire ai competenti organi decisionali attendibili e tempestivi elementi per l’adozione di eventuali misure correttive nella programmazione economica degli investimenti pubblici.

1.2 La missione dell’UVER sulla linea operativa “*Completamenti*”

Nel 1998 il CIPE ha destinato la somma di 1.807,6 milioni di euro, derivanti dalle risorse per le aree depresse assegnate con la legge 208/98, ad interventi finalizzati al completamento delle opere infrastrutturali rimaste incompiute.

Complessivamente sono stati ammessi a finanziamento 320 interventi, di cui 18 sono opere commissariate, individuate dall’ex art. 13 della legge n. 135/97, la cosiddetta norma “*sbloccacantieri*” (cfr. **Allegato 1** - Opere commissariate finanziate ex Legge 208/98).

Le delibere CIPE n. 52/99 e n. 135/99, nell’assegnare le risorse finanziarie ai singoli interventi da ultimare, hanno peraltro disposto che: “*l’Unità di Verifica degli investimenti pubblici (...) svolgerà le attività di competenza, riferendo sulle eventuali situazioni di criticità realizzativa al fine di consentire l’immediata rimozione degli ostacoli e di fornire un quadro di conoscenze da utilizzare per future assegnazioni o riallocazioni finanziarie*”.

L’UVER, con la linea operativa “*completamenti*”, attuando una sinergia con le Amministrazioni responsabili e/o con gli Enti attuatori, ha l’obiettivo di rendere fruibili le infrastrutture non ancora completate, diminuendo il rischio di eventuali dispersioni di risorse pubbliche.

L’azione dell’UVER, pertanto, è di sostegno agli Enti attuatori per una rapida realizzazione degli investimenti pubblici e, allo stesso tempo, all’organo politico, che ha ammesso a finanziamento il completamento dei progetti, per conoscere i motivi che possono ostacolarne la realizzazione o l’entrata in esercizio, anche in vista di future logiche di concessione dei fondi pubblici.



A tal fine il programma di investimento dei completamenti viene seguito dall'unità attraverso:


- l'area “*Verifica dei progetti*”, che effettua sopralluoghi in loco finalizzati agli obiettivi sopra indicati;
- l'area “*Monitoraggio e statistica*”, che gestisce il sistema di monitoraggio per la rilevazione dello stato di attuazione.

A distanza di quasi due anni dalle ultime verifiche in loco inerenti il programma in oggetto, l'UVER intende riprendere l'attività per valutare direttamente sul territorio il livello di avanzamento degli interventi.

Tale attività sarà finalizzata a fornire periodici aggiornamenti sullo stato di attuazione del programma (*note informative per il CIPE e contributi per il DPEF e il Rapporto sulle aree depresse*) ad analizzare le cause dei ritardi nonché eventuali profili di responsabilità dei soggetti coinvolti e le condizioni per il superamento degli ostacoli realizzativi.

Nella Figura 1, di seguito riportata, sono riprodotti i processi in cui si articola la linea operativa “*completamenti*”.

Figura 1 – I processi della linea operativa “completamenti”

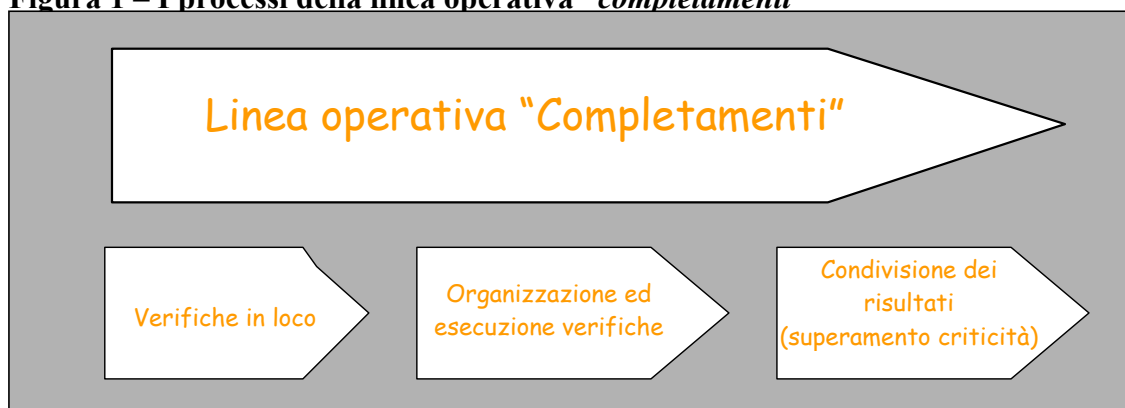

2. L'attività dell'UVER nella linea operativa “*Completamenti*”

2.1 Attività pregressa

Dal 1999 a oggi l'UVER ha effettuato 189 verifiche su 165 interventi, 5 indagini ricognitive e 9 fasi di monitoraggio. Sono state inoltre periodicamente elaborate note informative per il CIPE e contributi annuali per i Rapporti del Dipartimento.

In base alle crescenti esigenze informative sulla linea operativa “*completamenti*”, all'attività di verifica in loco, avviata nel 2000, l'UVER ha progressivamente affiancato altre iniziative per aggiornare le informazioni sullo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Inizialmente sono state acquisite tutte le informazioni dagli Enti attuatori per definire la situazione del programma dei completamenti in termini di interventi non avviati, avviati e ultimati e, successivamente, nel mese di settembre 2002, è stato monitorato l'avanzamento sia fisico che finanziario dei singoli interventi.

A partire dal 31 agosto 2002 sono state effettuate con cadenza quadrimestrale attività di monitoraggio sull'intero programma mediante la conferma e/o aggiornamento di un questionario precompilato con i dati noti, inviato via fax o email direttamente ai responsabili dei singoli progetti.

L'ultimo monitoraggio completo è riferito alla data del 30 aprile 2005 e grazie alla possibilità di previsione dell'avanzamento del programma grazie ad un apposito modello statistico il monitoraggio proseguirà con cadenza annuale al 31 dicembre.

2.2 Linea operativa “*completamenti*”: campo d'indagine

Degli originari 302 interventi finanziati dal CIPE per complessivi 1.505 milioni di euro, risultano ultimati 206.

Degli interventi ultimati, tre quarti (153 su 206) corrispondono a opere entrate in esercizio, mentre i restanti 53 non sono ancora in esercizio.

Gli interventi ancora in esecuzione sono 80, mentre sette interventi finanziati dal CIPE con 112,7 milioni di euro non sono ancora avviati. Infine gli ultimi 9 interventi sono stati definanziati e le corrispondenti risorse CIPE, pari a 27,8 milioni di euro, sono da riprogrammare.



Per i 7 interventi non avviati, l'UVER ha proposto al CIPE il definanziamento (vedi "Nota Informativa sullo stato dei completamenti al 31.12.2003 – Aprile 2004").

L'attività di verifica dell'UVER riguarderà in particolare gli 80 progetti ancora in esecuzione di cui 26 attualmente sospesi (cfr. Allegato 2 "Elenco interventi ex Legge 208/98 (completamenti) oggetto dell'attività UVER").

La seguente Tab. 1 riporta in dettaglio, per ogni regione e per le due macro-aree geografiche, il numero e l'importo ammesso a finanziamento dal CIPE degli interventi distinti per ultimati, in esecuzione, non avviati e da riprogrammare .

Tabella 1: Situazione "completamenti" al 30.04.2005 (Importi finanziamenti CIPE in migliaia di Euro)

Regione	Ultimati		In corso		Non avviati		Da riprogrammare		Totale	
	Numero	Finanz. CIPE	Numero	Finanz. CIPE	Numero	Finanz. CIPE	Numero	Finanz. CIPE	Numero	Finanz. CIPE
Abruzzo	14	13.174	7	59.129	0	0	0	0	21	72.303
Basilicata	2	16.527	4	23.241	2	7.747	0	0	8	47.514
Calabria	39	62.423	10	49.843	0	0	0	0	49	112.266
Campania	31	142.889	15	206.803	2	30.471	3	10.422	51	390.586
Molise	11	20.302	0	0	0	0	0	0	11	20.302
Puglia	37	125.349	14	46.579	1	516	2	3.202	54	175.646
Sardegna	5	36.174	3	37.701	0	0	1	7.747	9	81.622
Sicilia	16	49.168	9	307.370	2	73.927	1	362	28	430.827
Mezzogiorno	155	466.005	62	730.667	7	112.661	7	21.733	231	1.331.065
	(67,1%)	(35,0%)	(26,8%)	(54,9%)	(3,0%)	(8,5%)	(3,0%)	(1,6%)	(100,0%)	(100,0%)
Emilia Romagna	3	5.629	0	0	0	0	0	0	3	5.629
Friuli Venezia Giulia	3	10.329	1	1.343	0	0	1	4.870	5	16.542
Lazio	14	13.772	7	17.850	0	0	1	1.291	22	32.913
Liguria	1	3.099	2	18.398	0	0	0	0	3	21.497
Lombardia	4	9.141	0	0	0	0	0	0	4	9.141
Piemonte	5	11.693	3	22.022	0	0	0	0	8	33.715
P.A. Bolzano	1	1.833	0	0	0	0	0	0	1	1.833
P.A. Trento	2	1.149	0	0	0	0	0	0	2	1.149
Toscana	10	11.796	4	13.789	0	0	0	0	14	25.585
Valle d'Aosta	1	2.117	0	0	0	0	0	0	1	2.117
Veneto	7	21.895	1	2.324	0	0	0	0	8	24.219
Centro – Nord¹	51	92.453	18	75.727	0	0	2	6.161	71	174.340
	(71,8%)	(53,0%)	(25,4%)	(43,4%)	(0,0%)	(0,0%)	(2,8%)	(3,5%)	(100,0%)	(100,0%)
Italia	206	558.458	80	806.393	7	112.661	9	27.893	302	1.505.405
	(68,2%)	(37,1%)	(26,5%)	(53,6%)	(2,3%)	(7,5%)	(3,0%)	(1,9%)	(100,0%)	(100,0%)

Fonte: Monitoraggio UVER.



2.3 Area “*Verifica dei progetti*”: verifiche in loco

2.3.1 Finalità delle verifiche in loco

L’attività di verifica sarà effettuata in rapporto all’avanzamento dei lavori; in particolare per gli interventi:

- “*in esecuzione*” si concentrerà sulla osservazione dell’andamento dei lavori, supportando gli Enti attuatori per il superamento di eventuali limiti operativi.

In particolare, per i 26 interventi sospesi andrà rilevato il motivo della sospensione e, se possibile, saranno proposte le opportune determinazioni per una rapida ripresa dei lavori;

Compatibilmente con il carico di lavoro dell’UVER, l’attività di verifica potrà essere estesa anche agli interventi “*in esercizio*”, per i quali dovrà essere verificata l’efficacia dell’intervento relativamente alla fruizione dell’opera ultimata da parte della collettività, verificando, a chiusura della contabilità, il possibile rinvenimento di economie da riprogrammare anche per opere connesse all’intervento in esame.

2.3.2 L’organizzazione delle verifiche in loco

Il “*piano delle verifiche*” sarà definito in relazione all’avanzamento degli interventi, alle scadenze e alle problematiche e/o criticità evidenziate dagli Enti attuatori.

Per definire il campo di riferimento degli accertamenti e per individuare le problematiche da affrontare nel corso delle verifiche, si procederà, preliminarmente, ad acquisire su ogni singolo progetto la documentazione esistente (*ultimo monitoraggio*) e tutte le informazioni ottenibili mediante estrazione dalla banca dati gestita dall’area “*Monitoraggio e Statistica*” e/o da altre banche dati a disposizione dell’UVER.

Il Responsabile dell’UVER, designerà i componenti interessati dall’attività di verifica, incaricando ciascuno di essi delle verifiche da effettuare su un numero di interventi estratti dal campo d’indagine come in precedenza individuato.

Il Responsabile dell’UVER informerà i soggetti coinvolti (*Amministrazione Statale, Regione, Enti Territoriale, Soggetto privato, ecc.*) ed i Responsabili Unici dei Procedimenti, che l’intervento sarà oggetto di verifica da parte dell’Unità, provvedendo anche ad accreditare il componente incaricato.



Il Componente concorderà direttamente con il R.U.P. e/o il Dirigente interessato la data e il luogo della verifica, dandone comunque comunicazione, nei tempi necessari, a tutti i soggetti interessati e informati sullo stato di realizzazione del progetto, per consentire a questi ultimi, laddove lo ritenessero opportuno, di partecipare alla verifica.

La scelta della modalità del sopralluogo e delle verifiche rimane a giudizio dei singoli componenti dell'Unità che esercitano le proprie funzioni secondo le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, richiamato nell'art. 7 comma 4 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

2.3.3 Lo svolgimento delle verifiche in loco

La verifica si svolge, con la presenza e assistenza del Responsabile unico del procedimento e/o dei dirigenti competenti (in particolare nelle ipotesi di interventi ultimati), presso la sede dell'Ente attuatore e/o gestore ovvero presso la sede dei soggetti in possesso della documentazione idonea a fornire tutte le informazioni necessarie sullo stato del progetto, sui vari limiti operativi già superati o ancora in essere e su quant'altro attinente l'oggetto della verifica.

La verifica prevede un esame della documentazione necessaria all'individuazione delle eventuali problematiche connesse alla realizzazione dell'intervento, in relazione allo stato procedurale e di realizzazione dello stesso, ed in base alle criticità individuate e/o prospettate.

La documentazione oggetto di disamina, in funzione dell'obiettivo della verifica e in base al tipo e all'avanzamento dell'intervento può comprendere:

- il provvedimento relativo alla copertura finanziaria;
- i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari;
- gli elaborati dello studio di fattibilità, del progetto preliminare, definitivo o esecutivo (*in particolare relazione generale e quadro economico*);
- gli atti di gara dal bando al provvedimento di aggiudicazione;
- il contratto d'appalto e gli eventuali atti aggiuntivi, con i relativi provvedimenti di approvazione;
- i verbali di consegna lavori, delle eventuali sospensioni e ripresa lavori;



- gli eventuali provvedimenti di richiesta e concessione di proroghe;
- l'ultimo stato di avanzamento lavori e il relativo certificato di pagamento;
- le riserve eventualmente apposte dall'appaltatore sul registro di contabilità;
- gli ordini di servizio particolarmente significativi;
- gli eventuali provvedimenti adottati dalle competenti Autorità amministrative e/o giudiziarie;
- la documentazione idonea a quantificare lo stato di avanzamento finanziario dell'intervento;
- la relazione del Direttore dei lavori sulla descrizione delle opere già realizzate e di quelle ancora da realizzare, con l'indicazione della tempistica necessaria all'interno di un cronoprogramma approvato e aggiornato;
- il certificato di fine lavori;
- il certificato di collaudo;
- le note per l'avvio delle attività di funzionamento
- la data di entrata in esercizio.

Per meglio riscontrare le eventuali criticità individuate e/o prospettate e per meglio valutare lo stato di avanzamento dei lavori, alla fase dell'esame documentale segue, qualora ritenuto necessario dal Componente, il sopralluogo sul cantiere.


Terminata la verifica in loco, sulla base delle informazioni, della documentazione acquisita e il confronto con i responsabili dei singoli interventi, il Componente incaricato provvede alla redazione della scheda di verifica (*cfr.* Allegato 3 Scheda Verifica Completamenti) nella quale vengono riportate le informazioni sullo stato generale dell'intervento e in particolare le problematiche e/o criticità eventualmente riscontrate con le relative proposte e osservazioni per la risoluzione delle stesse.

In merito agli interventi ultimati ma non entrati in esercizio, il Componente avrà cura di valutare le cause del ritardo funzionale (problemi gestionali o di natura amministrativa, responsabilità individuali dei soggetti coinvolti) e adottare gli strumenti ritenuti più adeguati per la risoluzione delle problematiche rilevate (riunioni ad hoc, denunce di eventuali irregolarità riscontrate).

Nella seguente **figura 2** è schematizzata l'interazione delle attività delle verifiche in loco.



Figura 2 - Diagramma di flusso relativo alla verifica in loco

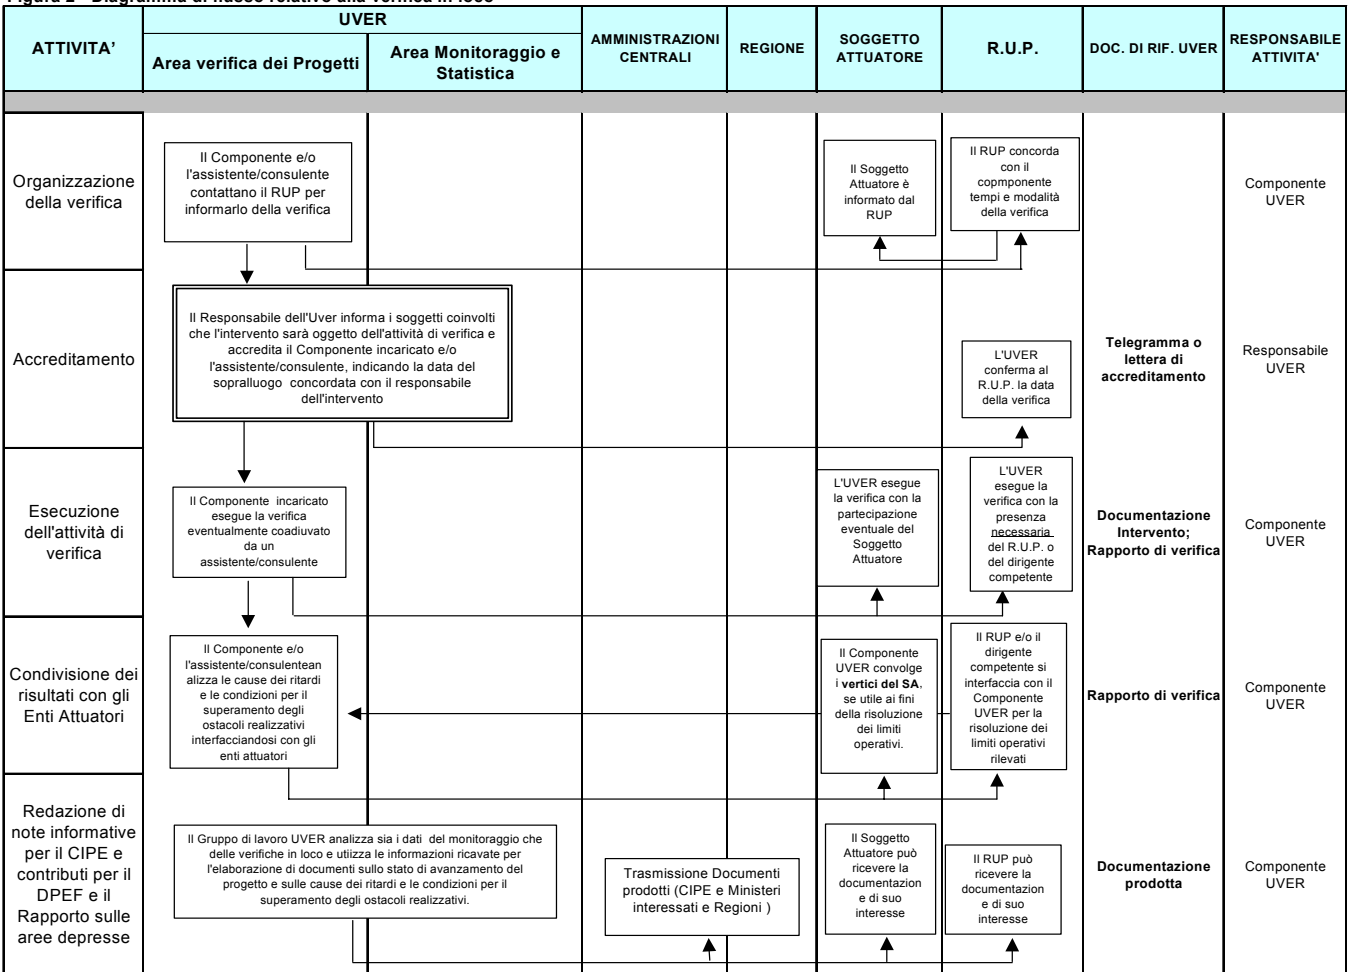

2.3.4 Modalità operative per i “completamenti” rientranti nella linea operativa “accompagnamento e assistenza”

Per gli interventi del programma “completamenti” che rientrano anche nella linea operativa “*accompagnamento e assistenza*” (vedi **Tabella 2** e **Allegato 2**), il componente avrà cura di pianificare le verifiche in loco inerenti l’attività di assistenza ed accompagnamento in modo coordinato rispetto all’avvio delle linea operativa di verifica specifica sui “completamenti”.

Tabella 2 – Distribuzione interventi “completamenti”

Tipologia “completamenti”	Totale interventi (a)	Attività UVER – Area verifica	
		“accompagnamento e assistenza” e “verifica completamenti” (b)	“verifica completamenti” (a-b)
In esecuzione	54	44 (1)	10
In esecuzione “sospesi”	26	2 (2)	24
Opere Commissariate	4	4 (3)	/
Non avviati	1	1 (2)	/
Ultimati in esercizio	3	3 (2)	/
Ultimati non in esercizio	3	3 (2)	/
Totali	91	57	34

(1) N. 8 interventi “in esecuzione” erano già inseriti nella linea operativa “accompagnamento e assistenza”. I restanti 36 entrano ora in “accompagnamento e assistenza”.

(2) Già inseriti nella linea operativa “accompagnamento e assistenza”.

(3) Già inseriti in “accompagnamento e assistenza”: due interventi sono ancora in corso (codici UVER: 7539 e 7541), dei restanti due il n. 7540 è “ultimato non in esercizio”, il n. 7538 “ultimato in esercizio” (vedi allegato 1).

Per questa tipologia di interventi (sottoposti, quindi, sia ad “accompagnamento e assistenza” e sia all’attività di verifica finalizzata alla redazione della nota informativa al CIPE sullo stato del programma “completamenti”) si avranno due schede: la scheda di “accompagnamento e assistenza” e la scheda verifica “completamenti”.

Il componente, in sede di verifica in loco, acquisirà i dati e le informazioni necessarie alla compilazione sia della scheda di “accompagnamento e assistenza” che della scheda di verifica “completamenti”.

I dati verranno inseriti prima nella scheda “accompagnamento e assistenza” (ad esempio, per l’intervento X); i dati e le informazioni comuni alle due schede saranno quindi scaricati in via informatica dalla scheda “accompagnamento e assistenza” nella corrispondente scheda “completamenti” (sempre inerente lo stesso intervento X e che rientra anche nel programma di verifica sui completamenti). Le



rimanenti informazioni saranno inserite quindi nella scheda verifica “completamenti” sulla base di quanto rilevato dal componente in sede di verifica in loco.

Per quanto concerne le modalità di esecuzione della verifica in loco inerente la linea operativa “accompagnamento e assistenza” si rinvia alle specifiche linee guida.



3. Il supporto al superamento delle criticità

3.1 Le criticità riscontrate e proposte per il superamento

La tipologia di criticità riscontrabili sono state classificate dall'UVER, sulla base della lunga esperienza maturata dai componenti dell'Unità e delle numerose verifiche eseguite sul territorio nel corso degli anni.

Di seguito si rappresenta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la tipologia più frequente di criticità che, solitamente, ostano alla normale realizzazione degli interventi:

- incompletezza o carenze della progettazione;
- indisponibilità del sito o degli immobili oggetto dell'intervento;
- contenzioso nella fase di affidamento dell'intervento;
- mancato o ritardato rilascio delle previste autorizzazioni;
- cause di forza maggiore (*avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, incidenti, scioperi*);
- difficoltà tecniche in fase esecutiva (*sorprese geologiche, ritrovamenti archeologici, rinvenimento di ordigni bellici, ecc.*);
- redazione e/o approvazione di perizie di variante;
- contenzioso in fase esecutiva (*sequestro cantiere, controversie con le imprese, fallimenti ecc.*);
- interferenze con sottoservizi, altre infrastrutture, attività in corso;
- difficoltà inerenti i flussi di finanziamento;
- inadeguatezza tecnica e/o inerzia dell'Ente attuatore;
- contenzioso nelle attività espropriative.

Individuata la criticità, il componente dell'UVER identifica la soluzione più adeguata e formula una proposta per il superamento della stessa, esprimendo, inoltre, un giudizio sui tempi occorrenti al superamento della stessa.

Nel caso di criticità oltre modo problematiche, l'UVER si riserva di sottoporre dettagliata informativa ai soggetti responsabili del finanziamento e della realizzazione dell'intervento (*Ministero, Regione, Soggetto attuatore, R.U.P.*); eventuali controdeduzioni formulate da parte di questi ultimi saranno oggetto di ulteriori approfondimenti del componente dell'UVER.



Sulla base delle informazioni acquisite con le attività di monitoraggio e verifica, l'UVER provvederà a predisporre periodici aggiornamenti sullo stato di attuazione del programma (*note informative per il CIPE e contributi per il DPEF e il Rapporto sulle aree depresse*), analizzando le cause dei ritardi e le eventuali condizioni per il superamento degli ostacoli realizzativi.



Appendice

Allegato 1: Opere commissariate finanziate ex Legge 208/98.

Situazione al 30.04.2005

N	Codice UVER	Attività UVER	Titolo	Finanz. CIPE (migl. di euro)	Situazione
1	7528		Ord. 2172/FPC/91 - Lavori di adeguamento sismico della scuola media superiore "Liceo Ginnasio Istituto Magistrale Flacco" di Via Vaccaro - Potenza	720,46	In esercizio (dal 19.9.2001)
2	7529		Ord. 2172/FPC/91 - Lavori di adeguamento sismico della scuola "G. Leopardi" – Potenza	1.334,52	Avanzamento 95% circa
3	7530		Uffici finanziari della Provincia – Cosenza	12.911,42	In esercizio (dal 10.3.2004)
4	7531		Ampliamento Palazzo di Giustizia - Paola (CS)	871,78	In esercizio (dal 19.2.2001)
5	7532		Costruzione Liceo Scientifico Catanzaro Lido	774,69	In esercizio (dal 7.1.2003)
6	7533		Raddoppio della ferrovia circumvesuviana linea Napoli-Poggioreale - Lavori di completamento delle opere civili nuova sede della linea - Napoli	1.962,54	N.D.
7	7534		Ferrovia circumvesuviana - Lavori di raddoppio e nuova sede della tratta Scisciano-Saviano della linea Napoli-Nola	12.911,42	DEFINANZIATA
8	7535		P.S./31/11 Completamento centrale ortofrutticola di Nocera (SA)	13.386,56	Avanzamento 95% circa
9	7536		Recupero ed adeguamento funzionale della piscina olimpica - Napoli	1.151,70	Lavori collaudati
10	7537		Completamento autostazione cittadina - Avellino	5.681,03	Lavori collaudati
11	7538	Accompagnamento	Recupero produttivo della città vecchia di Taranto	24.531,70	In esercizio (da gennaio 2005)
12	7539	Accompagnamento	P.S. 25/154 Diga sul Rio Pagghiolu-Tempio Pausania - Provincia di Sassari	9.812,68	Avanzamento 95% circa
13	7540	Accompagnamento	Museo Archeologico Nazionale di Olbia (SS)	3.098,74	Lavori ultimati
14	7541	Accompagnamento	Ristrutturazione e completamento del palazzo Ex Aeronautica da adibire a sede del comando GG.FF. – Palermo	7.746,85	Avanzamento 90% circa
15	7542		Legge 16/85 Concessione n. 1463 del 24/6/86: Caserma dei Carabinieri di Messina Ganzirri	1.430,59	Lavori ultimati
16	7543		Università degli Studi di Messina - Realizzazione della facoltà di Ingegneria - Messina	73.813,57	Lavori ultimati
17	7544		Legge 16/85 Concessione n. 1463 del 24/6/86: Caserma Carabinieri di Comiso (RG)	2.049,82	Lavori collaudati
18	18237		Caserma dei Carabinieri di Prato Drava (BZ)	996,76	In esercizio (dal 5.10.2001)



Allegato 2: Elenco interventi ex Legge 208/98 (completamenti) oggetto dell'attività UVER**Completamenti: interventi in esecuzione al 30.04.2005**

Numero	Linee operative UVER	settore	Cod UVER	Regione	Descrizione	Ente Attuatore
1	Accompagnamento	risorse culturali	7479	CAMPANIA	Biblioteca Nazionale, Napoli	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
2	Accompagnamento	risorse culturali	7395	CAMPANIA	Consolidamento, restauro e recupero funzionale castello e bastiglia medievali di Salerno	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - SALERNO
3	Accompagnamento	risorse culturali	7471	CAMPANIA	Sistema di illuminazione, area archeologica, Pompei	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI POMPEI ERCOLANO E STABIA
4	Verifica	risorse culturali	7477	CAMPANIA	Parco Archeologico, Velia	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER LE PROVINCE DI SALERNO AVELLINO E BENEVENTO
5	Verifica	risorse culturali	7468	CALABRIA	Parco Archeologico Scolacium, Roccelletta di Borgia	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA CALABRIA
6	Accompagnamento	risorse culturali	7347	CALABRIA	Progetto recupero ex Convento San Domenico, San Giorgio Morgeto	COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
7	Verifica	risorse culturali	18095	PIEMONTE	Reggia di Venaria Reale. Lotti CIPE	REGIONE PIEMONTE
8	Accompagnamento	risorse culturali	18116	TOSCANA	S. Romano Garfagnana: Fortezza di Verrucole	SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI PROVINCE PI, LI, LU E MS
9	Accompagnamento	Smaltimento reflui e rifiuti	7414	PUGLIA	Rete idrica e fognante, Motta Montecorvino	COMUNE DI MOTTAMONTECORVINO
10	Accompagnamento	Smaltimento reflui e rifiuti	7332	PUGLIA	Opere di disinquinamento ambientale ed utilizzazione delle acque dei bacini idrografici Cillarese e Reale (2° stralcio)	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE (SISRI - EX CONSORZIO ASI)
11	Accompagnamento	Smaltimento reflui e rifiuti	7455	PUGLIA	Potenziamento impianto di depurazione, Vico del Gargano	COMUNE DI VICO DEL GARGANO
12	Accompagnamento	Smaltimento reflui e rifiuti	7377	CAMPANIA	Lavori di costruzione rete fognaria urbana, Marcianise	COMUNE DI MARCIANISE
13	Accompagnamento	Smaltimento reflui e rifiuti	7451	CAMPANIA	Impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno - Rete dei	COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA RIFIUTI,



					collettori - Emissario di Gragnano, Casola, Lettere, ecc.	BONIFICA E TUTELA DELLE ACQUE
14	Accompagnamento	Smaltimento reflui e rifiuti	7453	CAMPANIA	Realizzazione del disinquinamento area Napoli Sud - Collettore litoraneo a servizio del comune di Portici	COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA RIFIUTI, BONIFICA E TUTELA DELLE ACQUE
15	Accompagnamento	Smaltimento reflui e rifiuti	18067	LAZIO	CO.B.I.S. Ampliamento impianto depurazione	A.C.E.A. AZIENDA COMUNALE ENERGIA E AMBIENTE
16	Accompagnamento	Smaltimento reflui e rifiuti	18070	LAZIO	Opere di completamento dell'impianto di depurazione consortile Rieti-Cittaducale: 3° lotto - Linea fanghi	CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DI RIETI E CITTADUCALE - RIETI
17	Accompagnamento	Smaltimento reflui e rifiuti	7422	SARDEGNA	Raccolta e depurazione reflui civili	ESAF, ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE - CAGLIARI
18	Accompagnamento	Smaltimento reflui e rifiuti	18112	TOSCANA	Adeguamento dei sistemi di smaltimento a mare delle acque reflue CM Elba e Capraia	COMUNITA' MONTANA ELBA E CAPRAIA
19	Accompagnamento	Smaltimento reflui e rifiuti	7464	SICILIA	Impianto di depurazione di contrada Fontanelle, Caltanissetta	COMUNE DI CALTANISSETTA
20	Accompagnamento	Smaltimento reflui e rifiuti	18086	LIGURIA	Realizzazione collegamento rete fognaria Bocca di Magra con depuratore di Camisano	A.C.A.M. AZIENDA CONSORZIO ACQUE METANO DI LA SPEZIA
21	Accompagnamento	dighe e reti idriche/risorse idriche	7445	SICILIA	C.B.7 Caltagirone - Sistemazione idraulica e forestale invaso Don Sturzo	CONSORZIO BONIFICA CALTAGIRONE - CALTAGIRONE (CT)
22	Accompagnamento	dighe e reti idriche/risorse idriche	7501	SICILIA	Lavori di costruzione dell'adduttore Gerbini - Magazzinazzo - Opere di completamento (C.B. 9 Catania)	CONSORZIO BONIFICA PIANA CATANIA - CATANIA
23	Verifica	dighe e reti idriche/risorse idriche	18108	VENETO	Completamento stralcio opere ed approvvigionamento idropotabile degli acquedotti dell'Alto Trevigiano dalla sorgente di fiumi connesse alla modifica della viabilità della SP 28 e SP 2 tra i Comuni di Vas (BL) e di Segusino (TV) mediante la realizzazione d	CONSORZIO ACQUEDOTTO SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO
24	Accompagnamento	dighe e reti idriche/risorse idriche	18071	LAZIO	Ristrutturazione rete irrigua in sinistra del fiume Liri in agro dei comuni di Broccostella e Campoli	CONSORZIO BONIFICA N.8 CONCA DI SORA - SORA (FR)

					Appennino in destra del fiume Fibreno, Fontechiari in sinistra del fiume Fibreno e Posta Fibreno - 2° lotto funzionale	
25	Accompagnamento	dighe e reti idriche/risorse idriche	7423	SARDEGNA	Opere di approvvigionamento idropotabile schema n. 39 del NPRGA - I lotto	EAF, ENTE AUTONOMO FLUMENDOSA - CAGLIARI
26	Accompagnamento	città	18118	FRIULI VENEZIA GIULIA	Completamento nuova caserma Polizia di Stato al valico di Tarvisio Arnoldstein (UD): realizzazione arredi poligono di tiro	PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
27	Verifica	città	7484	CAMPANIA	Edilizia demaniale: Completamento Palazzo di Giustizia di Napoli	PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA
28	Verifica	città	7482	CALABRIA	Edificio demaniale sede della Legione Carabinieri di Catanzaro	PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CALABRIA
29	Verifica	Città/edilizia universitaria e scolastica	7512	CAMPANIA	Università del Sannio - Consolidamento strutturale palazzo De Simone	UNIVERSITA' DEL SANNIO
30	Accompagnamento	Città/edilizia universitaria e scolastica	7510	CAMPANIA	Università del Sannio - Restauro e ristrutturazione complesso S. Agostino (ultimo lotto)	UNIVERSITA' DEL SANNIO
31	Verifica	Città/edilizia universitaria e scolastica	7518	PUGLIA	Politecnico di Bari Facoltà di Ingegneria - Realizzazione di nuovi spazi didattici al piano terra edificio centrale della facoltà di Ingegneria	POLITECNICO DI BARI
32	Accompagnamento	Città/edilizia universitaria e scolastica	7519	PUGLIA	Politecnico di Bari - Sopraelevazione degli Istituti di Chimica, Geologia e Trasporti	POLITECNICO DI BARI
33	Accompagnamento	Città/edilizia universitaria e scolastica	7520	SICILIA	Università di Catania Facoltà di Lettere - Manutenzione straordinaria degli ambienti prospicienti la Via Teatro Greco - Lotto di completamento del Corpo Aule - ex monastero dei Benedettini	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
34	Accompagnamento	Città/edilizia universitaria e	7502	ABRUZZO	Completamento sede della Facoltà di Farmacia in Chieti	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CHIETI



		scolastica			(finanziamento necessario 35,3 mld.)	
35	Accompagnamento	Città/edilizia universitaria e scolastica	7503	CALABRIA	Università di Catanzaro - Facoltà di Giurisprudenza - completamento 1° lotto e arredi ed attrezzature Facoltà (26.500)	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANZARO
36	Accompagnamento	Trasporto - Marittime lacuali e fluviali	7369	CALABRIA	Viabilità di golena torrente Calopinace	COMUNE DI REGGIO CALABRIA
37	Accompagnamento	Trasporti/strade	7317	CALABRIA	Completamento asse viario Mirto-Longobucco-Sila 2° lotto Pantano SS. 177	COMUNITA' MONTANA SILA GRECA COSENTINA
38	Accompagnamento	Trasporti/strade	7431	SICILIA	Completamento autostrada Messina-Palermo (lotti legge 208/98)	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
39	Verifica	Trasporti/strade	7443	SICILIA	ASI - CT - Lavori completamento Viabilità Piano Tavole - Belpasso	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE ZONA NORD DELLA SICILIA ORIENTALE - CATANIA
40	Accompagnamento	Trasporti/strade	7489	SICILIA	Viabilità: autostrada Siracusa-Gela	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
41	Accompagnamento	Trasporti/strade	7312	BASILICATA	"Cavonica" lavori di completamento tronchi 1° e 2°	REGIONE BASILICATA
42	Accompagnamento	Trasporti/strade	7309	BASILICATA	SS. 655 Bradanica - 2° lotto, 3° lotto del Capoposto - 2° stralcio funzionale dalla SS. 168 alla SS. 169	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
43	Accompagnamento	Trasporti/Infrastrutture portuali	7391	CAMPANIA	Porto di Pozzuoli - Adeguamento area portuale e piazzale movimentazione	REGIONE CAMPANIA
44	Accompagnamento	Trasporti/ferrovie	7525	ABRUZZO	Lavori di completamento Ferrovia Sangritana: Costruzione bretella di raccordo viario nuova Stazione di Lanciano-SS. 84 Frentana e completamento lavori di miglioramento della tratta ferroviaria esistente Archi-Castel di Sangro	GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA FERROVIA SANGRITANA
45	Accompagnamento	Trasporti/strade	7427	SARDEGNA	Rete viaria di collegamento Siamanna-S'Accu de Is Crebus	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ORISTANO
46	Accompagnamento	Trasporti/strade	7421	PUGLIA	Completamento 1° mediana sovrappasso Ponente, Molfetta	COMUNE DI MOLFETTA

47	Verifica	Trasporti/strade	18069	LAZIO	Completamento della Superstrada Sora-Ferentino	REGIONE LAZIO
48	Accompagnamento	Trasporto/Trasporti urbano	7526	CAMPANIA	Linea Metropolitana di Napoli: tratta Dante-Garibaldi-C.D.N.	COMUNE DI NAPOLI
49	Accompagnamento	Trasporto/Trasporti urbano	18127	LIGURIA	Metro Genova: Completamento tratta Caricamento – Sarzano	COMUNE DI GENOVA
50	Accompagnamento	infr. Produttive/Sistemi locali di sviluppo	7300	ABRUZZO	Infrastrutturazione della parte dell'agglomerato industriale di Pile, L'Aquila	CONSORZIO PER IL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AQUILA - L'AQUILA
51	Accompagnamento	Sistemi locali di sviluppo/produzione di energia	7308	ABRUZZO	Completamento centrale idroelettrica di Villa Vomano	CONSORZIO DI BONIFICA NORD BACINO DEL TRONTO TORDINO E VOMANO
52	Accompagnamento	Città	7365	CALABRIA	Riqualificazione tessuto urbano e turistico, Fiumefreddo Bruzio	COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO
53	Accompagnamento	Città	18094	PIEMONTE	Centro convegni conferenze "Sociale", ricostruzione ex teatro di Pinerolo	COMUNE DI PINEROLO
54	Accompagnamento	Sistemi locali di sviluppo/turismo	7326	PUGLIA	Completamento porto turistico, Vieste	COMUNE DI VIESTE



Completamenti: Interventi in esecuzione sospesi al 30.04.2005

Numero	Attività UVER	Settore	Cod UVER	Regione	Descrizione	Ente Attuatore
1	Verifica	risorse culturali	7437	SICILIA	Restauro S. Maria La Vetere, Militello Val di Catania	SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI CATANIA
2	Verifica	risorse culturali	7467	ABRUZZO	Sistema Archeologico Antica Teate (43.970 mln.), Chieti	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER L'ABRUZZO
3	Verifica	risorse culturali	7470	CALABRIA	Adeguamento funzionale dell'Archivio di Stato, Cosenza	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
4	Verifica	risorse culturali	18115	TOSCANA	Pisa: Polo museale del Lungarno	SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI PROVINCE PI, LI, LU E MS
5	Verifica	risorse culturali	7314	BASILICATA	Restauro e consolidamento castello Malconsiglio, Miglionico	COMUNE DI MIGLIONICO
6	Verifica	Smaltimento reflui e rifiuti	7454	PUGLIA	Impianto di depurazione, Mesagne	COMUNE DI MESAGNE
7	Verifica	Smaltimento reflui e rifiuti	7458	PUGLIA	Costruzione rete fognatura nera, Bagnolo	COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO
9	Verifica	Smaltimento reflui e rifiuti	7335	PUGLIA	Ristrutturazione fognature nere con sostituzione tronchi con altri di diametro maggiore - Potenziamento impianti di sollevamento esistenti, Bari	COMUNE DI BARI
8	Accompagnamento	Smaltimento reflui e rifiuti	7463	SICILIA	Costruzione impianto di depurazione nelle contrade Testa dell'Acqua e Calabernardo in Noto - 3° lotto	COMUNE DI NOTO
10	Verifica	Smaltimento reflui e rifiuti	7383	CAMPANIA	Completamento collettori fognari, Marano	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
11	Accompagnamento	risorse idriche	7481	ABRUZZO	Risorse idriche: completamento diga di Chiauci	CONSORZIO DI BONIFICA SUD - BACINO MORO-SANGRO-SINELLO E TRIGNO
12	Verifica	risorse idriche	7493	CAMPANIA	Completamento dell'irrigazione in destra fiume Volturno - III lotto - 2° stralcio (C.B. Sannio Alifano)	CONSORZIO BONIFICA SANNIO ALIFANO - PIEDIMONTE MATESE (CE)
14	Verifica	Città/edilizia universitaria e	7325	CALABRIA	Progetto esecutivo per l'adeguamento antisismico del Villaggio scolastico, Castrovillari	COMUNE DI CASTROVILLARI



		scolastica				
15	Verifica	Città/edilizia universitaria e scolastica	7517	PUGLIA	Politecnico di Bari Facoltà di Ingegneria - Opere di adeguamento e ristrutturazione dei padiglioni delle facoltà di Ingegneria in V.le Japigia	POLITECNICO DI BARI
16	Verifica	Città/edilizia universitaria e scolastica	18125	PIEMONTE	Completamento centro polifunzionale del Lingotto: centro di eccellenza per la ricerca, formazione e sostegno dell'attività economica e di servizio nel settore dentario e facciale	UNIVERSITA' DI TORINO
17	Verifica	Trasporti/strade	18074	LAZIO	Completamento variante n. 7 SS Appia - Cisterna - 2° lotto	REGIONE LAZIO
18	Verifica	Trasporti/porti	18123	LAZIO	Porto di Gaeta. Banchinamento testata molo Salvo d'Acquisto	DIREZIONE GENERALE OPERE MARITTIME
19	Verifica	Trasporti/strade	7405	PUGLIA	Completamento e sistemazione della rete stradale a servizio degli insediamenti produttivi per il ripristino della funzionalità ed il pieno utilizzo dei suoli ricadenti dell'agglomerato industriale di Bari-Modugno	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI - BARI
20	Verifica	Trasporti urbani	7418	PUGLIA	Lavori di ampliamento e completamento del parcheggio a raso in zona Cappella del centro abitato, Margherita di Savoia	COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
21	Verifica	Trasporti urbani	7523	ABRUZZO	Chieti: Il lotto dei lavori di completamento linea filoviaria	COMUNE DI CHIETI
22	Verifica	difesa suolo	7315	BASILICATA	Completamento sistemazione emissario vallone Laghi di Monticchio, comuni di Atella e Rionero PZ	REGIONE BASILICATA
23	Verifica	difesa suolo	18084	LAZIO	Dissesti idrogeologici del bacino Liri-Garigliano. II fase. Interventi di sistemazione dei dissesti. Sito di Ferentino	REGIONE LAZIO
23	Verifica	difesa suolo	18103	TOSCANA	Completamento lavori di consolidamento movimento franoso in località La Ripa	COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
24	Verifica	Città	7354	CALABRIA	Progetto di completamento Viale della Pace - S.P. per Triparni con opere igienico sanitarie per risanamento zona, Vibo Valentia	COMUNE DI VIBO VALENTIA
25	Verifica	Sistemi locali di sviluppo	7417	PUGLIA	Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione del P.Z. 167 in località Regina, Margherita di Savoia	COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
26	Verifica	Sistemi locali di sviluppo	7381	CAMPANIA	Completamento III lotto costruzione porto turistico in loc. Marina di Caterola, Capri	COMUNE DI CAPRI

Completamenti: interventi ultimati non in esercizio al 30.04.2005

Numero	Attività UVER	Settore	Cod UVER	ID progetto	Regione	Descrizione	Ente Attuatore
1	Accompagnamento	Smaltimento reflui e rifiuti	7466		SICILIA	Realizzazione PARF, 3° stralcio, Licata	COMUNE DI LICATA
2	Accompagnamento	Smaltimento reflui e rifiuti	7465		SICILIA	Condotta sottomarina di allontanamento dei reflui depurati, Trapani	COMUNE DI TRAPANI
3	Accompagnamento	risorse idriche	7496		PUGLIA	Opere di regolazione del sistema idrico "Irrigazione Salento" - Nodi idraulici Avetrana, Monteruga e Zanzara (C.B. Arneo)	CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO - NARDO' (LE)

Completamenti: interventi ultimati in esercizio al 30.04.2005

Numero	Attività UVER	Settore	Cod UVER	ID progetto	Regione	Descrizione	Ente Attuatore
1	Accompagnamento	depuratori e reti fognarie	7406		PUGLIA	Invaso artificiale del Cillerese - Impianto di chiarificazione acquedotto industriale. Completamento e miglioramento opere realizzate con i progetti ASI/INF/187 e SAI/BR/162/2	Consorzio per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese (SISRI ex consorzio ASI)
2	Accompagnamento	depuratori e reti fognarie	7407		PUGLIA	Piattaforma polifunzionale per il trattamento e smaltimento dei rifiuti di origine industriale - Area industriale di Brindisi - Completamento e miglioramento opere realizzate con il finanziamento Casmez PS/SA/BR/1305 Agensud 2724 e BOO5	Consorzio per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese (SISRI ex consorzio ASI)
3	Accompagnamento	dighe e reti idriche	7426		SARDEGNA	Schema n. 2 del NPRGA - Potenziamento e rifacimento dorsale rete nord Liscia	ESAF – Ente sardo acquedotti e fognature - Cagliari



Completamenti: interventi non avviati al 30.04.2005

Numero	Attività UVER	Settore	Cod UVER	ID progetto	Regione	Descrizione	Ente Attuatore
1	Accompagnamento	depuratori e reti fognarie	7452		CAMPANIA	Collegamento rete fognaria Comune di Torre del Greco all'impianto di depurazione alla foce del Fiume Sarno.	COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA RIFIUTI, BONIFICA E TUTELA DELLE ACQUE



Allegato 3: Schede di verifica

SCHEDA VERIFICA COMPLETAMENTI

1. Svolgimento della verifica

Stato intervento

In esecuzione

Ultimato non in esercizio

Verifica

Verifica effettuata in loco

SI

NO

Denominazione
del progetto

Codice UVER

Asse di appartenenza

Referenti	Ruolo	Telefono	Telefax	e-mail

Ente attuatore

Ente gestore

2. Descrizione dell'intervento

Descrizione
del progetto



Effetti	Interregionale	<input type="checkbox"/>	Interprovinciale	<input type="checkbox"/>
	Intercomunale	<input type="checkbox"/>	Comunale	<input type="checkbox"/>

Localizzazione

Regioni	
Province	
Comuni	

Tipologia dell'intervento	Nuovo intervento (<i>nuova realizzazione non legata direttamente al progetto originario</i>)	<input type="checkbox"/>
	Ampliamento (<i>nuova costruzione legato direttamente al progetto originario</i>)	<input type="checkbox"/>
	Adeguamento (<i>interventi sull'opera realizzata, imposti da normativa</i>)	<input type="checkbox"/>
	Altro (<i>specificare</i>)	<input type="checkbox"/>

Categoria opera	<input type="text" value="(1)"/>	Sub-categoria	<input type="text" value="(1)"/>
-----------------	----------------------------------	---------------	----------------------------------

Intervento unico	<input type="checkbox" value="SI"/>	Lotto	<input type="text"/>	di	<input type="text"/>	Stralcio	<input type="text"/>	di	<input type="text"/>
	<input type="checkbox" value="NO"/>								

Importo intervento

3. Quadro finanziario

Risorse finanziarie	Riferimento	Importo
Unione Europea <input type="checkbox"/>		
Stato <input type="checkbox"/>		
Regione <input type="checkbox"/>		
Ente territoriale <input type="checkbox"/>		
Privato <input type="checkbox"/>		
Altro <input type="checkbox"/>		

Note

(1) Confronta tabella allegata



4. Fase progettuale (non compilare per interventi "ultimati non in esercizio")

Livello di progettazione	Fattibilità	<input type="text" value="___/___/___(2)"/>	Preliminare	<input type="text" value="___/___/___(2)"/>
	Definitivo	<input type="text" value="___/___/___(2)"/>	Esecutivo	<input type="text" value="___/___/___(2)"/>

Approvazione del progetto	Ente Attuatore	<input type="text" value="___/___/___(2)"/>	Richiesta	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value="NO"/>	<input type="text" value="N.N(3)"/>
	V.I.A. (Regione)	<input type="text" value="___/___/___(2)"/>	Richiesta	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value="NO"/>	<input type="text" value="N.N(3)"/>
	V.I.A. (Min. Ambiente)	<input type="text" value="___/___/___(2)"/>	Richiesta	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value="NO"/>	<input type="text" value="N.N(3)"/>
	Regione (C.T.A.R.)	<input type="text" value="___/___/___(2)"/>	Richiesta	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value="NO"/>	<input type="text" value="N.N(3)"/>
	Cons. Sup. LL.PP.	<input type="text" value="___/___/___(2)"/>	Richiesta	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value="NO"/>	<input type="text" value="N.N(3)"/>
	Conferenza Servizi	<input type="text" value="___/___/___(2)"/>	Richiesta	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value="NO"/>	<input type="text" value="N.N(3)"/>
	Altro	<input type="text" value="___/___/___(2)"/>	Richiesta	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value="NO"/>	<input type="text" value="N.N(3)"/>

Note

5. Scelta contraente (non compilare per interventi "ultimati non in esercizio")

Affidamento lavori	Asta pubblica	<input type="checkbox"/>	Licitazione privata	<input type="checkbox"/>
	Appalto concorso	<input type="checkbox"/>	Trattativa privata	<input type="checkbox"/>

Contenzioso

Motivazioni

Appaltatore Cod.Fisc.

Contratto Ribasso (%) Tempo contrattuale (gg.)

Consegna lavori

(2) Se la data è successiva a quella di riferimento trattasi di previsione
 (3) Non necessaria



6. Proroghe, perizie, sospensioni (compilare solo per interventi "in esecuzione")

Proroghe concesse Giorni Mesi

Termine suppletivo Giorni Mesi

Sospensione lavori	<input type="text"/>	Ripresa lavori	<input type="text"/> (2)
Sospensione lavori	<input type="text"/>	Ripresa lavori	<input type="text"/> (2)
Sospensione lavori	<input type="text"/>	Ripresa lavori	<input type="text"/> (2)
Sospensione lavori	<input type="text"/>	Ripresa lavori	<input type="text"/> (2)
Sospensione lavori	<input type="text"/>	Ripresa lavori	<input type="text"/> (2)
Sospensione lavori	<input type="text"/>	Ripresa lavori	<input type="text"/> (2)
Sospensione lavori	<input type="text"/>	Ripresa lavori	<input type="text"/> (2)
Sospensione lavori	<input type="text"/>	Ripresa lavori	<input type="text"/> (2)
Sospensione lavori	<input type="text"/>	Ripresa lavori	<input type="text"/> (2)

Perizie	Importo	<input type="text"/>	Approvazione	<input type="text"/> (2)
	Importo	<input type="text"/>	Approvazione	<input type="text"/> (2)
	Importo	<input type="text"/>	Approvazione	<input type="text"/> (2)
	Importo	<input type="text"/>	Approvazione	<input type="text"/> (2)
	Importo	<input type="text"/>	Approvazione	<input type="text"/> (2)

Ultimazione lavori originaria Ultimazione lavori aggiornata (2)



7. Quadro economico (Per gli interventi "ultimati non in esercizio" compilare il quadro economico, fine lavori, appr. Collaudo, esercizio, erogazioni effettuate)

Quadro economico	Base d'appalto	Contratto originario (a)	Contratto vigente (b)	Differenza (c=b-a)
Lavori				
Somme disposizione				
Riserve	0,00			
Totale				

Ultimo S.A.L. Lavori eseguiti a tutto il / / Importo netto

Fine lavori / / Appr. collaudo / / ⁽²⁾ Esercizio / / ⁽²⁾

Note

Erogazioni effettuate	Importi a tutto il 31/12/2004	Importi alla data della verifica
Lavori		
Somme a disposizione		
Riserve		
Totale		

Riserve SI NO Importo richiesto Importo concesso

Motivazioni



8. Criticità

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Incompletezza o carenze del progetto | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Indisponibilità del sito o degli immobili | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Contenzioso nell'affidamento dei lavori | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Mancato o ritardato rilascio delle autorizzazioni | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Difficoltà tecniche in fase esecutiva
(<i>sorprese geologiche, ritrovamenti archeologici, ritrovamenti ordigni bellici, ecc.</i>) | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Redazione e/o approvazione perizia di variante | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Contenzioso in fase esecutiva | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Interferenze con sottoservizi | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Difficoltà inerenti flussi finanziari finanziamento | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Inadeguatezza tecnica e/o inerzia ente attuatore | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Attività espropriative | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Altro (specificare) | <input type="checkbox"/> |

Relativamente agli interventi ultimati ma non ancora in esercizio si riportano alcune specifiche criticità:

- | | | |
|----|---------------------------------|--------------------------|
| 14 | Interdipendenza con altri lotti | <input type="checkbox"/> |
| 15 | Ulteriori lavori in corso | <input type="checkbox"/> |
| 16 | Acquisto forniture | <input type="checkbox"/> |
| 17 | Stipula contratti di servizio | <input type="checkbox"/> |
| 18 | Altro (specificare) | <input type="checkbox"/> |



Per ogni criticità riscontrata:

Cod.	Inizio	Superamento	Fase interessata
	__/__/__	__/__/__(2)	(4)
Descrizione criticità			
Soggetti interessati			
Azioni intraprese o previste per il superamento della criticità e/o ulteriori proposte			

Cod.	Inizio	Superamento	Fase interessata
	__/__/__	__/__/__(2)	(4)
Descrizione criticità			
Soggetti interessati			
Azioni intraprese o previste per il superamento della criticità e/o ulteriori proposte			

- (4) PR = Progettazione (dalla progettazione preliminare alla progettazione esecutiva)
 AF = (dalla progettazione alla consegna dei lavori)
 ES = Esecuzione (dalla consegna all'ultimazione dei lavori)
 AT = Attivazione (dall'ultimazione dei lavori all'entrata in esercizio)



Cod.	Inizio	___/___/___	Superamento	___/___/___ ⁽²⁾	Fase interessata	⁽⁴⁾
Descrizione criticità						
Soggetti interessati						
Azioni intraprese o previste per il superamento della criticità e/o ulteriori proposte						



9. Valutazioni del Componente

Giudizio sintetico
sul progetto

Giudizio sintetico
su tempi



Tabella Categorie e sub categorie

CATEGORIA	SUB_CATEGORIA
STRADE	AUTOSTRADE
	STRADE PROVINCIALI E COMUNALI
	STRADE STATALI
	ALTRE OPERE
AEROPORTUALI	FABBRICATI D'USO
	PISTE
	ALTRE OPERE
FERROVIE	FABBRICATI D'USO
	FERROVIARIE
	FUNIVIE, SEGGIOVIE, FUNICOLARI
	METROPOLITANE E TRAMVIARIE
	ALTRE OPERE
MARITTIME, LACUALI E FLUVIALI	FABBRICATI D'USO
	INTERPORTI
	OPERE PORTUALI
	PORTI COMMERCIALI
	PORTI TURISTICI
	IDROVIE
	ALTRE OPERE
IDRICHE-IDRAULICHE- IGIENICO SANITARIA	ACQUEDOTTI-POTABILIZZATORI
	CAPTAZIONE-ADDUZIONE
	DEPURATORI-FOGNATURE
	DIGHE
	IRRIGAZIONE
	SISTEMAZIONI IDRAULICHE
	ALTRE OPERE
DIFESA SUOLO	CONSOLIDAMENTO
	SISTEMAZIONE IDRAULICA
	ALTRE OPERE
DIFESA AMBIENTE	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
	ALTRE OPERE
ENERGIA	METANODOTTI GASDOTTI E SIMILI
	ALTRE OPERE
PRODUZIONE TRASPORTO DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	DISTRIBUZIONE
	FABBRICATI D'USO
	GEOTERMoeLETRICA
	IDROELETTRICA
	NUCLEOTERMoeLETRICA
	TRASPORTO E TRASFORMAZIONE
	TERMoeLETRICA
	ALTRE OPERE



COMUNICAZIONI E TELEMATICA	AUTOMAZIONE E MECCANIZZAZIONE PP.TT.
	FABBRICATI D'USO
	TELECOMUNICAZIONE
	ALTRE OPERE ED IMPIANTI
EDILIZIA DEMANIALE	INTERESSE STORICO E ARTISTICO
	MONUMENTALE
	PENITENZIARIA
	PUBBLICA
	SOCIALE, CULTURALE E ASSISTENZIALE
	RISTRUTTURAZIONI E RICOSTRUZIONI
	ALTRE OPERE
EDILIZIA PUBBLICA PER SERVIZI DESTINABILI ALLA VENDITA	COSTRUZIONI EDILIZIA SOVVENZIONATA
	COSTRUZIONI EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA
	ALTRE OPERE
EDILIZIA SANITARIA	OSPEDALIERA
	PRESIDI SANITARI
	ALTRE OPERE
EDILIZIA SCOLASTICA	ASILI NIDO
	MATERNE
	RICERCA SCIENTIFICA
	SCOLASTICA
	UNIVERSITARIA
ALTRE OPERE	
STRUTTURE PER IL COMMERCIO	
STRUTTURE TURISTICHE E PER LO SPETTACOLO	
BENI CULTURALI	
ARCHIVI E BIBLIOTECHE	
INFRASTRUTTURE URBANE	RIQUALIFICAZIONI
	INFRASTRUTTURE CIVILI PER COMPLESSI RESIDENZIALI
	INFRASTRUTTURE CIVILI
	ALTRE OPERE
INFRASTRUTTURE INDUSTRIALI	CIVILI PER AREE INDUSTRIALI
	EDIFICI INDUSTRIALI
	ALTRE OPERE
FORESTAZIONE	
ZOOTECNIA	
STRUTTURE SPORTIVE	
INCENTIVI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	
