



La valutazione d'efficacia: primo rapporto UVER

Marzo 2006

1. La valutazione d'efficacia

La nuova politica per gli investimenti pubblici ha permesso di riportare risultati significativi sul piano della qualità dei processi di selezione degli interventi e della esplicitazione e misurazione dei tempi e dei costi necessari per realizzarli.

Il giudizio (e, dove presente, il dibattito) sui progetti e sulle opere si è così concentrato sulla loro fattibilità e, successivamente, sul loro avanzamento procedurale. Su quest'ultimo punto, dove si esercita l'attività di verifica in senso stretto, l'Unità di verifica degli investimenti pubblici ha dato negli ultimi anni diversi contributi che sono andati incontro alle effettive esigenze delle Istituzioni operanti sul territorio.

Ora, anche grazie al rafforzamento realizzato nell'analisi *ex ante* degli interventi e al loro monitoraggio attivo *in itinere*, è possibile chiudere il ciclo *ex post*, **valutando se gli interventi realizzati producono effettivamente i servizi per cui erano stati originariamente finanziati.**

Con questo rapporto sulla Valutazione di Efficacia, l'UVER fa un primo significativo passo in questa direzione, allargando il campo di osservazione dal parametro tempi-costi alla verifica dell'effettiva entrata in esercizio dell'opera, e dei benefici da questa prodotti per la collettività.

Il cittadino-utente, davanti a un'opera pubblica che entra in servizio, è portato a giudicarla con parametri assai semplici, riassumibili in due domande chiave: "A cosa serve questa strada, o questo depuratore, o questo edificio?", e "Valeva la pena di spendere i nostri soldi per realizzarlo?" Per rispondere a queste domande l'UVER ha ricostruito in modo accurato la storia di ogni singolo intervento finanziato con le delibere CIPE di completamento 52 e 135 del 1999, e ora sta andando sul posto a constatare direttamente, tramite una metodologia composta di analisi qualitative e indicatori quantitativi, e tramite il confronto dei risultati della valutazione di efficacia con quanto previsto e atteso al momento della decisione del finanziamento, cosa è stato realizzato, e con quali benefici per la popolazione interessata.

Tre ragioni hanno determinato la scelta di questo specifico gruppo di interventi per questo tipo di attività:

- i. rappresentano uno dei primi risultati importanti della "nuova programmazione";
- ii. il processo che ha portato al loro finanziamento fa sì che per essi sia disponibile un livello apprezzabile di quantificazione *ex ante* degli obiettivi che si intendevano raggiungere;
- iii. l'UVER fin dalle sue prime fasi ne ha costantemente monitorato l'avanzamento in base al mandato specifico delle delibere CIPE 52 e 135 del 1999.

La prima tornata della nuova attività UVER di Valutazione di Efficacia degli investimenti pubblici sul territorio ha riguardato circa il trenta per cento della totalità del campo di indagine. Per questo primo gruppo il novanta per cento degli interventi visionati ha ricevuto una valutazione di efficacia complessivamente positiva.

Per ora il giudizio UVER di valutazione di efficacia positiva riflette unicamente la **capacità di una infrastruttura realizzata di produrre benefici per la collettività di riferimento in misura paragonabile alle finalità per le quali era stata finanziata**, senza, stabilire correlazioni rigide tra tali benefici e i costi e i tempi che sono stati necessari per ottenerli.

Va detto, comunque, che nella maggior parte dei casi gli approfondimenti in loco hanno indicato la necessità di **rafforzare la consapevolezza della centralità dell'utilizzo finale e dei beneficiari delle infrastrutture**, sia negli organi deputati alla programmazione delle stesse, sia in quelli responsabili della loro realizzazione e successiva gestione.

Per quanto riguarda i pochi, ma significativi, casi di efficacia negativa degli investimenti, l'UVER propone l'adozione di meccanismi atti a sanzionare ai diversi livelli le responsabilità dei singoli e delle Amministrazioni.

2. Campo di indagine e sintesi dei risultati: il primo sottoinsieme esaminato

Gli interventi di completamento finanziati con le delibere 52 e 135 del 1999 sono complessivamente 320¹, successivamente ridotti a 310 in seguito a dieci revoche.

L'UVER ha deciso di sottoporre a valutazione di efficacia **tutti** gli interventi di completamento i quali, in base ai dati di monitoraggio disponibili, risultino:

- non avviati²;
- conclusi, ma ancora non in esercizio³
- conclusi e in esercizio⁴.

Tab. 1. Interventi di completamento esaminati al 28/02/2006

	Totale	Non avviati	In corso	Conclusi non in esercizio	Conclusi in esercizio
Interventi di completamento	310	7	82	74	147
Interventi oggetto di valutazione d'efficacia	228	7	//	74	147
Interventi esaminati al 28/02/2006	60	7	//	9	44

- Per i sette interventi non avviati UVER ha già proposto con specifica e separata *Nota informativa al CIPE* (discussa e accolta nella seduta preliminare del 23 febbraio 2006) la revoca dei relativi finanziamenti e il recupero alla disponibilità del Comitato di somme corrispondenti tramite detrazioni dalle prossime assegnazioni di competenza delle amministrazioni responsabili degli interventi stessi.

¹ Tra questi sono compresi anche 18 opere commissariate.

² Un intervento si considera 'non avviato' quando dai dati di monitoraggio non risulta che sia stata pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori, ovvero, qualora non sia previsto l'affidamento, i lavori non siano comunque stati iniziati.

³ Un intervento si considera 'concluso non in esercizio' quando dai dati di monitoraggio risulta che sia stato redatto il certificato di ultimazione lavori.

⁴ Un intervento si considera 'concluso in esercizio' quando l'ente attuatore comunica all'UVER che l'opera è entrata in esercizio-

- Gli interventi attualmente ancora in corso di realizzazione saranno trattati come di consueto nella Nota informativa di monitoraggio annuale che UVER renderà disponibile nel mese di Aprile 2006.
- Gli interventi conclusi non in esercizio sono trattati separatamente nell'ultima sezione di questo rapporto.

Per quanto riguarda gli interventi conclusi in esercizio già sottoposti a verifica, l'attività sintetizzata in questo Primo rapporto UVER in tema di Valutazione d'efficacia ha permesso di formulare per ciascuno di essi una valutazione di efficacia sintetica (POSITIVA/NEGATIVA).

Su un totale di 44 interventi sinora verificati, è stata attribuita una **valutazione di efficacia POSITIVA a 40 interventi (90%)**. In termini di risorse stanziare dal CIPE, su un totale (per questo sottoinsieme di interventi) di 171,21 milioni di euro, risultano **andati a buon fine 167,91 milioni di euro (98%)**.

Fig. 1. Valutazione di efficacia degli interventi conclusi e già in esercizio


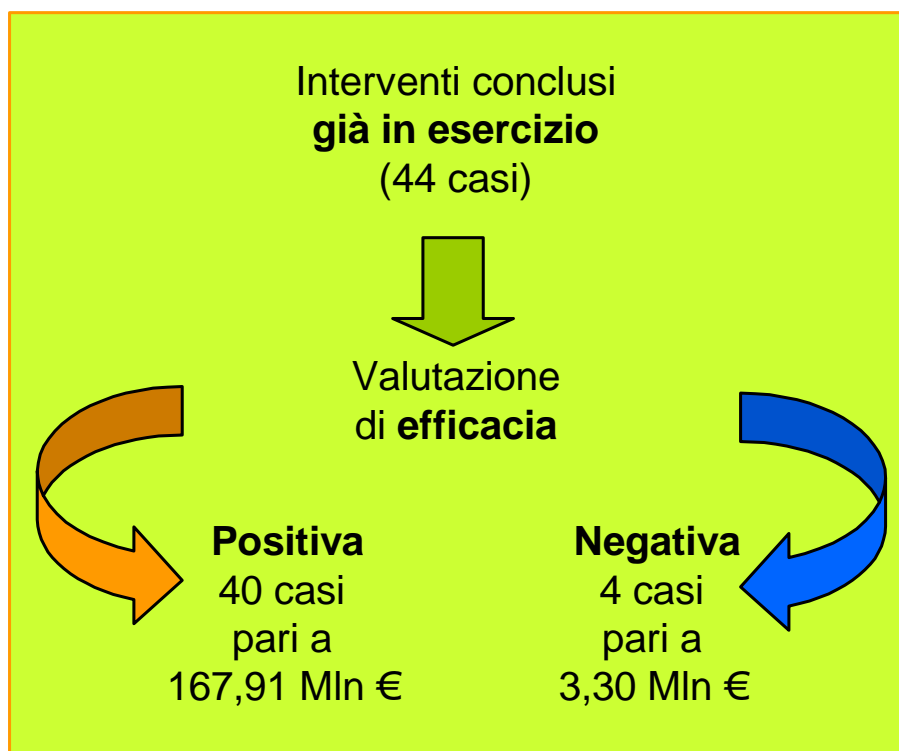


Fig. 2. Distribuzione territoriale del primo sottoinsieme di interventi oggetto della valutazione d'efficacia con relativi giudizi sintetici

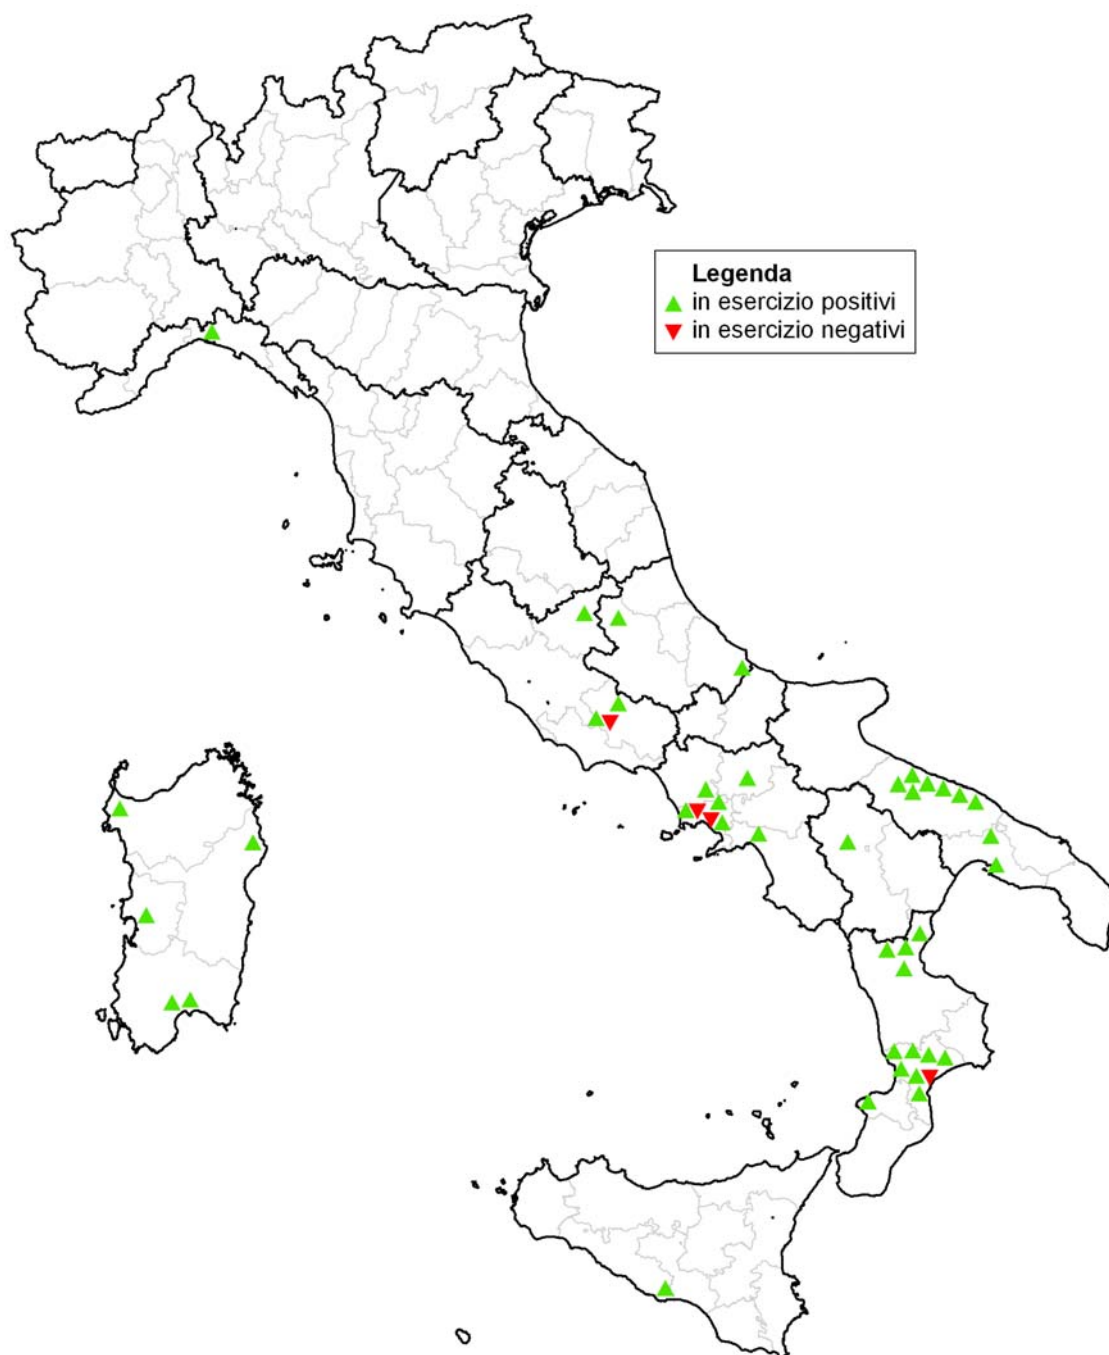

Il giudizio sintetico di valutazione di efficacia (POSITIVA/NEGATIVA) è in realtà il frutto di un lavoro complesso di cui si dà ampio conto nell'*Allegato 1: il metodo di valutazione*. In questa sede è comunque opportuno anticipare che il punto di partenza per esprimere il giudizio sul singolo intervento è sempre rappresentato dal confronto dei dati di previsione ex-ante con i risultati ottenuti ex-post. Tale confronto utilizza un concetto flessibile di “margine di scostamento accettabile” ed è poi necessariamente integrato dall'osservazione concreta dello specifico contesto dell'intervento stesso sulla base dell'esperienza e della professionalità dei componenti dell'UVER. L'*Allegato 2: le schede degli interventi* riporta per ciascun intervento le schede di valutazione dettagliate.

È inoltre importante sottolineare che **gli interventi esaminati sinora rappresentano solamente un sottoinsieme (44 su 147) del complesso di quelli che verranno valutati nel corso dell'attività, e non un campione statistico rappresentativo**⁵. Le ripartizioni degli interventi per assi, settori di intervento e dimensione finanziaria sono comunque riportate nell'All. 1.

⁵ Il primo sottoinsieme di interventi sottoposti a valutazione di efficacia deriva unicamente dall'opportunità di programmare le verifiche in loco nel modo più efficiente ai fini della capacità produttiva interna dell'UVER, e pertanto non può essere considerato statisticamente rappresentativo dell'universo che si intende osservare.

3. Elenco degli interventi conclusi e in esercizio esaminati al 28.02.2006

SOTTOINSIEME INTERVENTI ESAMINATI - 'Concluso In esercizio'

Codice scheda GURI	Regione	Titolo	Amm.ne competente	Ente Attuatore	Finanziamento CIPE Meuro	Valutazione di efficacia
1 29	ABRUZZO	Completamento dei lavori di sostituzione del sistema fognario e depurativo intercomunale (Piatola Peligna, Cofino, Prezza, Raiano, Roccasale e Vittorito - AQ)	REGIONE ABRUZZO	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO VALLE PELIGNA - ALTO SANGRO (CAVPAS)	0,540	Positiva
2 1	ABRUZZO	Completamento della rete fognaria a servizio dell'agglomerato industriale di San Salvo, Vasto	REGIONE ABRUZZO	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL VASTESE - VASTO (CH)	0,810	Positiva
3 901	BASILICATA	Ord. 2172/FPC/91 - Lavori di adeguamento sismico della scuola media superiore "Liceo Gimnasio Istituto Magistrale" di Via Vaccaro - Potenza	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - POTENZA	COMUNE DI POTENZA	0,720	Positiva
4 905	CALABRIA	Costruzione Liceo Scientifico "Fermi" di Catanzaro Lido	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - CATANZARO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - CATANZARO	0,770	Positiva
5 725	CALABRIA	Università di Catanzaro - infrastrutture per funzionamento 1° e 2° lotto Medicina e Chirurgia e 1° lotto Giurisprudenza SCIENTIFICA	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANZARO	6,150	Positiva
6 88	CALABRIA	Lavori di completamento della S.P. variante esterna di Sambiasi - 4° ed ultimo lotto	REGIONE CALABRIA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - CATANZARO	0,520	Positiva
7 66	CALABRIA	Sistemazione idrogeologica di Canal Greco parte Nord, Castrovillari	REGIONE CALABRIA	COMUNE DI CASTROVILLARI	0,210	Positiva
8 69	CALABRIA	Riqualificazione socio economica ed ambientale del Centro Storico-PIC URBAN-Localizzazione centro storico comune di Catanzaro	REGIONE CALABRIA	COMUNE DI CATANZARO	1,000	Positiva
9 70	CALABRIA	Lavori di completamento dell'impianto Sportivo in località Lenza di Gagliano	REGIONE CALABRIA	COMUNE DI CATANZARO	0,490	Negativa
10 138	CALABRIA	Completamento ristrutturazione auditorium Liceo Classico "Galluppi", Catanzaro	REGIONE CALABRIA	COMUNE DI CATANZARO	1,290	Positiva
11 113	CALABRIA	Parco naturale, archeologico, speleologico della Cessuta, Cerchiara di Calabria	REGIONE CALABRIA	COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA	1,370	Positiva
12 87	CALABRIA	Lavori di costruzione di una piscina coperta in località Chiantia - Comune di Sambiasi	REGIONE CALABRIA	COMUNE DI LAMEZIA TERME	1,260	Positiva
13 68	CALABRIA	Lavori Ostello della Gioventù in Miglierina	REGIONE CALABRIA	COMUNE DI MIGLIERINA	0,310	Positiva
14 141	CALABRIA	Costruzione palestra coperta polifunzionale, Terranova da Sibari	REGIONE CALABRIA	COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI	0,400	Positiva
15 71	CALABRIA	Strada interprovinciale SS.106 Jonica-Rocca Imperiale-Fondovalle Canina-Ponte Ragone-Confine Lucano-4° Lotto	REGIONE CALABRIA	COMUNITA' MONTANA ALTO IONIO	1,810	Positiva
16 88	CALABRIA	Opere di completamento del Porto di IV classe di Tropea	REGIONE CALABRIA	REGIONE CALABRIA	4,030	Positiva

Situazione al 28/02/2006

SOTTOINSIEME INTERVENTI ESAMINATI - 'Concluso In esercizio'

Codice scheda GUFRI	Regione	Titolo	Amm.ne competente	Ente Attuatore	Finanziamento CIPE Meuro	Valutazione di efficacia	
17	728	CAMPANIA	Nuova sede della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e della Facoltà di Economia e Commercio - Edifici D - F - Il lotto - 2° stralzo - Università di Napoli Federico II	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II	22,720	Positiva
18	730	CAMPANIA	Università di Salerno - Completamento complesso Aula Magna - Rettorato - Biblioteca e sistemazioni esterne	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	2,970	Positiva
19	735	CAMPANIA	Università del Sannio - Completamento e recupero funzionale degli spazi di palazzo Bosco Lucarelli	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	UNIVERSITA' DEL SANNIO	0,140	Positiva
20	602	CAMPANIA	Valorizzazione patrimonio archeologico Area Flegrea, area archeologica di Cuma, Pozzuoli	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER LE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA	4,960	Positiva
21	603	CAMPANIA	Valorizzazione patrimonio archeologico Area Flegrea, necropoli di San Vito, Pozzuoli	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER LE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA	0,830	Negativa
22	214	CAMPANIA	Parcheggio sotterraneo Piazza Carlo III, Caserta	REGIONE CAMPANIA	COMUNE DI CASERTA	10,850	Positiva
23	215	CAMPANIA	Parcheggio sotterraneo Piazza IV novembre, Caserta	REGIONE CAMPANIA	COMUNE DI CASERTA	2,580	Positiva
24	909	CAMPANIA	Recupero ad adeguamento funzionale della piscina olimpica - Napoli	REGIONE CAMPANIA	ENTE AUTONOMO MOSTRA D'OLTREMARE E DEL LAVORO ITALIANO NEL MONDO	1,150	Negativa
25	39	LAZIO	Progetto di completamento della rete fognaria Via Colterosa - Supino	REGIONE LAZIO	COMUNE DI SUPINO	0,080	Positiva
26	51	LAZIO	Risanamento igienico-ambientale della zona di S. Giuseppe Le Prata. Bacino imbrifero del Fiume Cosa. Veroli	REGIONE LAZIO	COMUNE DI VEROLI	1,230	Positiva
27	19	LAZIO	Completamento realizzazione Campo Pozzi per alimentazione reti tubate per bonifica integrale comprensorio Tufano in agro di Anagni e Ferentino	REGIONE LAZIO	CONSORZIO BONIFICA SUD - ANAGNI (FR)	0,830	Negativa
28	40	LAZIO	Sistemazione movimento franso interessante la SS n. 17 dell'Appennino Abruzzese - Antrdoco	REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO	0,290	Positiva
29	73	LIGURIA	Realizzazione nuova condotta sottomarina del depuratore di Genova Pegli	REGIONE LIGURIA	COMUNE DI GENOVA	3,100	Positiva
30	743	PUGLIA	Politecnico di Bari - Interventi di bonifica del MECA e delle opere di ripristino presso alcuni edifici della facoltà di Ingegneria	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	POLITECNICO DI BARI	0,590	Positiva

Situazione al 28/02/2006

SOTTOINSIEME INTERVENTI ESAMINATI - 'Concluso In esercizio'

Codice scheda GUPRI	Regione	Titolo	Amm.ne competente	Ente Attuatore	Finanziamento CIPE Meuro	Valutazione di efficacia
31 675	PUGLIA	Edilizia demaniale: delegazione regionale Corte dei Conti	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA	1,490	Positiva
32 326	PUGLIA	Recupero complesso conventuale S. Teresa dei Maschi, Bari	REGIONE PUGLIA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - BARI	3,620	Positiva
33 328	PUGLIA	Recupero e ristrutturazione ex complesso monastico S. Domenico, Molfetta	REGIONE PUGLIA	COMUNE DI MOLFETTA	0,440	Positiva
34 331	PUGLIA	Recupero e ristrutturazione dell'ex convento San Domenico, Molfetta	REGIONE PUGLIA	COMUNE DI MOLFETTA	2,020	Positiva
35 332	PUGLIA	Consolidamento statico e recupero funzionale del Torrione Passari nel Centro Antico, Molfetta	REGIONE PUGLIA	COMUNE DI MOLFETTA	0,310	Positiva
36 333	PUGLIA	Ristrutturazione e restauro dell'Ospedale dei Crociati, Molfetta	REGIONE PUGLIA	COMUNE DI MOLFETTA	0,750	Positiva
37 911	PUGLIA	Recupero produttivo della città vecchia di Taranto	REGIONE PUGLIA	COMUNE DI TARANTO	24,530	Positiva
38 365	PUGLIA	Rinnovo binario rotaia 50 UNI e risanamento massicciata linea Martina Franca-Lecce	REGIONE PUGLIA	Ferrovie del sud-est - Gestione commissariale governativa	22,210	Positiva
39 386	SARDEGNA	Collegamento Guardia Gibara - Terraseo	REGIONE SARDEGNA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - CAGLIARI	2,140	Positiva
40 387	SARDEGNA	Strada bivio SS. 126 (Guspini), S. Antonio di Santadi	REGIONE SARDEGNA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - CAGLIARI	1,020	Positiva
41 388	SARDEGNA	Riordino irriguo del distretto Serra Arena - 1° stralcio-1° lotto	REGIONE SARDEGNA	CONSORZIO BONIFICA CAMPIDANO DI ORISTANO - ORISTANO	11,120	Positiva
42 382	SARDEGNA	Ammodernamento impianti irrigui servizi invaso fiume Posada, Simisola	REGIONE SARDEGNA	CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE - NUORO	6,820	Positiva
43 383	SARDEGNA	Schema n. 2 del NPRGA - Potenziamento e rifacimento dorsale rete nord Liscia	REGIONE SARDEGNA	ESAF - ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE - CAGLIARI	15,080	Positiva
44 561	SICILIA	Realizzazione PARF, 3° stralcio, Licata	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	COMUNE DI LICATA	5,660	Positiva
Riepilogo					Totale	171,210
Totale interventi esaminati 44						
di cui: - valutazione di efficacia POSITIVA n. 40						
- valutazione di efficacia NEGATIVA n. 4						

Situazione al 28/02/2006

4. Le proposte per il CIPE

Si ritiene opportuno che il CIPE, tramite apposita delibera:

1. prenda atto dell'indagine in corso, facendo propri i primi risultati e le prime conclusioni qui presentate;
2. affidi al Dipartimento per le politiche di sviluppo l'incarico di dare ampia diffusione ai risultati e alle conclusioni di cui sopra (prevedendone la pubblicazione, anche sul sito dipartimentale), e di trasmetterli, in particolare, a tutte le amministrazioni coinvolte e agli altri soggetti a vario titolo interessati al fine di favorire la massima trasparenza dei futuri processi di allocazione di risorse aggiuntive agli interventi in questione;
3. disponga, per gli interventi classificati con *valutazione di efficacia negativa*, di recuperare alla disponibilità del Comitato somme corrispondenti ai finanziamenti concessi nel 1999, tramite specifiche detrazioni dalle prossime assegnazioni di competenza delle amministrazioni responsabili degli interventi stessi, nella misura di seguito specificata:

Amministrazione	N° interventi con efficacia negativa	Importo da detrarre da prossima ripartizione FAS (milioni di Euro)
1 Regione Calabria	1	0,49
2 Regione Campania	1	1,15
3 Regione Lazio	1	0,83
4 Ministero BBCC	1	0,83
Totale	4	3,30

Parallelamente e indipendentemente dalle proposte formulate per il CIPE, l'Unità di verifica, sulla base del suo specifico mandato normativo e di una prassi consolidata, promuoverà le opportune azioni presso le amministrazioni coinvolte per ridurre il rischio di possibili sprechi o immobilizzazioni di risorse finanziarie pubbliche. Allo stesso modo, ove si ravvisino fattispecie di illeciti, queste saranno portate all'attenzione dei competenti organi giurisdizionali.


5. Gli interventi conclusi non in esercizio

Nell'ambito dell'attività in corso, l'UVER ha ritenuto opportuno visionare anche gli interventi conclusi ma non ancora in esercizio in considerazione dell'ovvia immobilizzazione improduttiva di risorse finanziarie pubbliche sottesa a tali fattispecie.

Tali interventi non potevano evidentemente essere valutati in base alla loro efficacia. Per questo gruppo di interventi si è invece proceduto a una classificazione diversa (GIUSTIFICATO/NON GIUSTIFICATO) incentrata sul mancato esercizio stesso.

Su un totale di 9 interventi verificati, **in ben 4 casi si è ritenuto NON GIUSTIFICATO l'attuale stato di mancato esercizio.**

Fig. 3. Valutazione di efficacia degli interventi conclusi e non ancora in esercizio

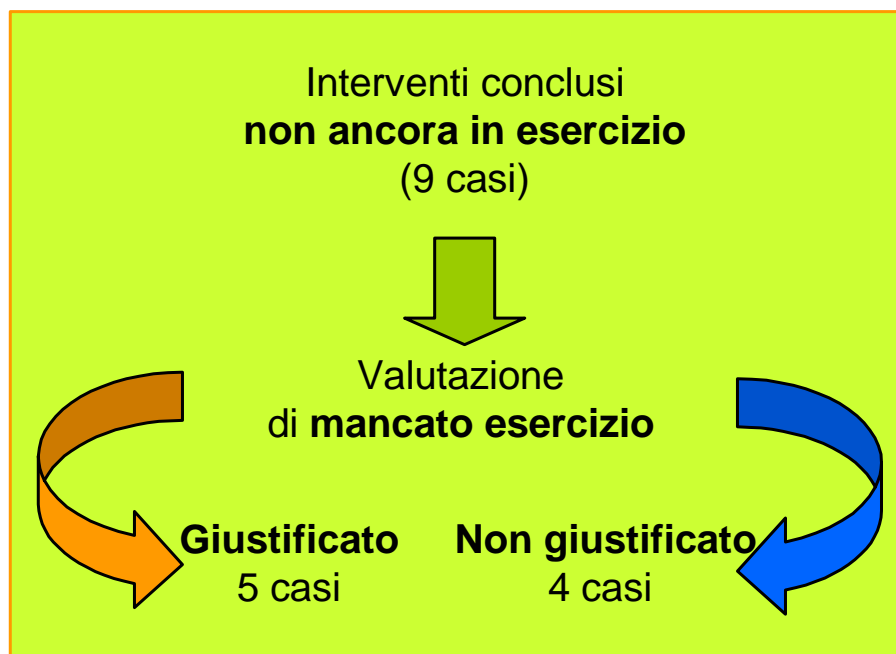

Questa classificazione degli interventi conclusi non in esercizio si fonda su un'analisi delle cause addotte dagli enti attuatori a fondamento del mancato esercizio, rapportata a un tempo di risoluzione ragionevole per problematiche di quel tipo. Le schede in Allegato 2 forniscono maggiori dettagli per ogni specifico intervento.

Per gli interventi con mancato esercizio non giustificato UVER ritiene opportuno che il CIPE si riservi di applicare la procedura di recupero delle somme originariamente concesse in modo analogo a quanto già proposto per gli interventi con valutazione di efficacia negativa, qualora entro 90 giorni dalla comunicazione dei risultati di questo Rapporto gli interventi stessi non siano entrati in esercizio.

6. Elenco degli interventi conclusi e non in esercizio esaminati al 28.02.2006

SOTTOINSIEME INTERVENTI ESAMINATI - 'Concluso Non in esercizio'

Codice scheda GURI	Regione	Titolo	Amm.ne competente	Ente Attuatore	Finanziamento CIPE Meuro	Valutazione mancato esercizio
1	ABRUZZO	Completamento dell'impianto di depurazione della rete idrica e fognaria dell'agglomerato industriale di Val Sinello	REGIONE ABRUZZO	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL VASTESE - VASTO (CH)	0,770	Giustificato
2	CALABRIA	Università di Catanzaro Facoltà di medicina e chirurgia - 1° lotto - 2° stralzo	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANZARO	4,130	Giustificato
3	CALABRIA	Università di Catanzaro Facoltà di medicina e chirurgia - 2° lotto	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANZARO	14,360	Giustificato
4	CAMPANIA	Università di Salerno - Realizzazione III blocco - II Stralzo - Stecca 7 del plesso di Fisciano	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	10,330	Giustificato
5	PUGLIA	Completamento 1° mediana sovrappasso Ponente, Molfetta	COMUNE DI MOLFETTA	COMUNE DI MOLFETTA	2,310	Giustificato
6	PUGLIA	Risorse idriche: rete idrica e fognaria di Laterza	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	COMUNE DI LATERZA	2,840	N/Giustificato
7	PUGLIA	Opere di regolazione del sistema idrico "Irrigazione Salerno" - Nodi Idrantici Averana, Moneruga e Zanzara (C.B. Arneo)	MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO - NARDO (LE)	10,070	N/Giustificato
8	PUGLIA	Parco urbano "Madonna della Grotta", Bari	REGIONE PUGLIA	Azienda Municipalizzata Igiene Urbana - Comune di Bari	1,390	N/Giustificato
9	PUGLIA	Parco Lama Balice-Bari: interventi, fruizione aree	REGIONE PUGLIA	COMUNE DI BARI	1,550	N/Giustificato
Riepilogo					Totale	47,760
Totale interventi esaminati 9						
di cui: - valutazione mancato esercizio GIUSTIFICATO n. 5						
- valutazione mancato esercizio NON GIUSTIFICATO n. 4						

Situazione al 28/02/2006
